


Spoorboekje Bergermeer Gasopslag

Onderwerp: Spoorboekje Bergermeer Gasopslag

'Spoorboekje' vergunningtraject Bergermeer Gasopslag
Versie 10juni2009

BEP = Bureau Energieprojecten
BG's = Bevoegde Gezagen
Cmer = Commissie voor de milieueffectrapportage
EZ = Ministerie van Economische Zaken
TQ = TAQA Energy B.V.
VROM = Ministerie van VROM
ROv = leden Regio-overleg
VOv = leden Vergunningen-overleg

Procedure in de tijd:

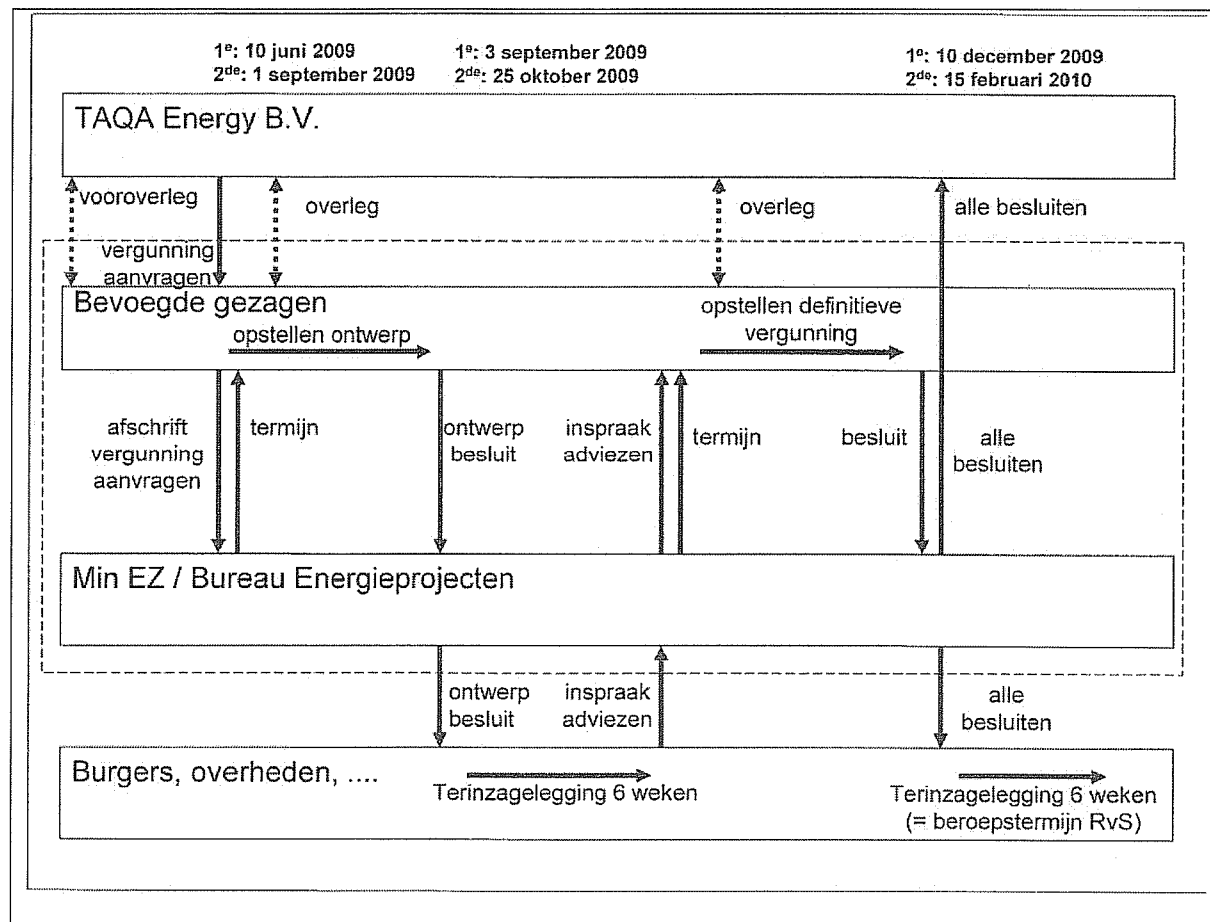

In chronologische volgorde vergunningen mandje 1:

Datum	Activiteit	Actie door
9apr09	Vergunningenoverleg	VOv
10jun09	Alle vergunningaanvragen mandje 1 ingediend bij BG's <ul style="list-style-type: none"> BG's sturen vergunning direct door naar BEP (voor coördinerende minister) 	TQ
12 jun09	Versturen van voorontwerp-Rijksinpassingsplan	EZ
15jun09-24jul09	Advies op voorontwerp-Rijksinpassingsplan	BG's
15jun09-21jun09	Termijnbrief: brief van coördinerende minister aan BG's met termijn voor ontwerpbesluiten mandje 1	EZ
29jun09	Bro-overleg artikel 3.1.1	BG's
29jun09+1jul09	Wro-overleg artikel 3.28, lid 1	Raden en GS
03jul09 10-12 uur	Vergunningen-overleg over aanvragen en opstellen concept-ontwerpbesluiten	VOv
Mrt09-17aug09	Opstellen concept ontwerp-besluiten: <ul style="list-style-type: none"> Rijksinpassingsplan Besluiten op aanvraag 	EZ
11jun-17aug09		BG's
17aug09	Ontwerpbesluiten moeten bij BEP zijn	BG's
	Vorbereiding van terinzagelegging	


17aug09-21aug09 21aug09-27aug09 19aug09-2sept09	<ul style="list-style-type: none"> • Check op teksten ontwerp-besluiten • Eventueel aanpassingen • Reproductie / terinzage-mappen maken • Kennisgevingsadvertenties ontwerpbesluiten (afzender = EZ/VROM) • Alle BG's hebben complete set ontwerpbesluiten ontvangen 	BEP / EZ BG's BEP BEP BEP
3sept09-14okt09	Terinzagelegging ontwerpbesluiten + ontwerprijksinpassingsplan <ul style="list-style-type: none"> • Stukken liggen bij alle BG's + digitaal op website • 1 loket voor inspraak bij BEP (voor projectminister) • BEP maakt regiedocument voor terugkoppeling inspraak aan BG's • Elk BG verantwoordelijk voor behandeling inspraak op eigen besluiten 	BEP BEP BG's
Eind sept09	Informatieavonden (hoorzittingen?) <ul style="list-style-type: none"> • Organisatie door BEP en EZ/VROM 	BEP/EZ/BG's
Eind okt09	Termijnbrief: brief van coördinerend minister aan BG's met bevestiging termijnen besluiten	EZ
15okt09-20nov09	Verwerken advies en inspraak; definitief maken van besluiten	BG's
23nov09	Besluiten moeten bij BEP zijn	BG's
23nov-30nov09 30nov09-4dec09 23nov09-4dec09 8dec09	Vorbereiding van terinzagelegging <ul style="list-style-type: none"> • Check op teksten ontwerp-besluiten • Eventueel aanpassingen • Reproductie / terinzage-mappen maken • Kennisgevingsadvertenties besluiten (afzender = EZ/VROM) • Alle BG's hebben complete set ontwerpbesluiten ontvangen 	BEP / EZ BG's BEP BEP BEP
10dec09-20jan10	Terinzagelegging besluiten + rijksinpassingsplan = beroepstermijn <ul style="list-style-type: none"> • Stukken liggen bij alle BG's + digitaal op website • Direct beroep bij Raad van State • Elk BG verantwoordelijk voor verweerschrift op eigen besluiten (regie bij EZ) 	BEP BG's
21jan10	Besluit onherroepelijk (als geen beroep)	
Mei10 Feb10 Mrt10 Jan11	Indien wel beroep wordt ingesteld: <ul style="list-style-type: none"> • Appellanten kunnen verzoek tot voorlopige voorziening indienen • Raad van State doet in 4 maanden uitspraak op verzoek tot voorlopige voorziening (indien rechter akkoord gaat moet TAQA werkzaamheden stilleggen tot uitspraak beroep) • Juridische afdeling EZ maakt regiedocument voor terugkoppeling beroep aan BG's • BG's stellen verweerschriften op (zwaartepunt zal bij de ministeries van EZ/VROM/LNV liggen) • Raad van State doet binnen 12 maanden uitspraak in beroepszaken 	EZ BG's
Medio10	TAQA bouwwerkzaamheden Bergermeer: <ul style="list-style-type: none"> • TAQA kan na verlening vergunningen ook bij beroep op eigen risico beginnen • Na 4 maanden doet Raad van State uitspraak op de voorlopige voorzieningen en kan eventueel een deel van de werkzaamheden stilgelegd worden • Indien dit niet gebeurt kan TAQA voor eigen risico verder bouwen hangende de beroepszaken 	

In chronologische volgorde vergunningen mandje 2:

<i>Datum</i>	<i>Activiteit</i>	<i>Actie door</i>
9apr09	Vergunningenoverleg	VOv
1sep09	Alle vergunningaanvragen mandje 1 ingediend bij BG's <ul style="list-style-type: none"> • BG's sturen vergunning direct door naar BEP (voor coördinerende minister) 	TQ
2sep09-9sep09	Termijnbrief: brief van coördinerende minister aan BG's met termijn voor ontwerpbesluiten mandje 1	EZ
2sept-25okt09	Opstellen concept ontwerp-besluiten: <ul style="list-style-type: none"> • Besluiten op aanvraag 	BG's
26okt09	Ontwerpbesluiten moeten bij BEP zijn	BG's
26okt09-30okt09 2nov09-6nov09 26okt09-9ov09	Vorbereiding van terinzagelegging <ul style="list-style-type: none"> • Check op teksten ontwerp-besluiten • Eventueel aanpassingen • Reproductie / terinzage-mappen maken • Kennisgevingsadvertenties ontwerpbesluiten (afzender = EZ/VROM) 	BEP / EZ BG's BEP BEP BEP

	<ul style="list-style-type: none"> Alle BG's hebben complete set ontwerpbesluiten ontvangen 	
12nov09-23dec09	Terinzagelegging ontwerpbesluiten <ul style="list-style-type: none"> Stukken liggen bij alle BG's + digitaal op website 1 loket voor inspraak bij BEP (voor projectminister) BEP maakt regiedocument voor terugkoppeling inspraak aan BG's Elk BG verantwoordelijk voor behandeling inspraak op eigen besluiten 	BEP BEP BG's
Eind nov09	Informatieavonden (/hoorzittingen?) <ul style="list-style-type: none"> Organisatie door BEP en EZ/VROM 	BEP/EZ/BG's
Eind dec09	Termijnbrief: brief van coördinerend minister aan BG's met bevestiging termijnen besluiten	EZ
24dec09-13feb10	Verwerken advies en inspraak; definitief maken van besluiten	BG's
15feb10	Besluiten moeten bij BEP zijn	BG's
15feb10-20feb10	Voorbereiding van terinzagelegging <ul style="list-style-type: none"> Check op teksten ontwerp-besluiten Eventueel aanpassingen 	BEP / EZ BG's
20feb10-27feb10	<ul style="list-style-type: none"> Reproductie / terinzage-mappen maken 	BEP
27feb10-3mrt10	<ul style="list-style-type: none"> Kennisgevingsadvertenties besluiten (afzender = EZ/VROM) 	BEP
2mrt10	<ul style="list-style-type: none"> Alle BG's hebben complete set ontwerpbesluiten ontvangen 	BEP
4mrt10-14apr10	Terinzagelegging besluiten = beroepstermijn <ul style="list-style-type: none"> Stukken liggen bij alle BG's + digitaal op website Direct beroep bij Raad van State Elk BG verantwoordelijk voor verweerschrift op eigen besluiten (regie bij EZ) 	BEP BG's
15apr10	Besluit onherroepelijk (als geen beroep)	
Aug10	Indien wel beroep wordt ingesteld: <ul style="list-style-type: none"> Appellanten kunnen verzoek tot voorlopige voorziening indienen Raad van State doet in 4 maanden uitspraak op verzoek tot voorlopige voorziening (indien rechter akkoord gaat moet TAQA werkzaamheden stilleggen tot uitspraak beroep) 	
Jun10	<ul style="list-style-type: none"> Juridische afdeling EZ maakt regiedocument voor terugkoppeling beroep aan BG's 	EZ
Mei10	<ul style="list-style-type: none"> BG's stellen verweerschriften op (zwaartepunt zal bij de ministeries van EZ/VROM/LNV liggen) 	BG's
Apr12	<ul style="list-style-type: none"> Raad van State doet binnen 12 maanden uitspraak in beroepszaken 	
Medio11	TAQA bouwwerkzaamheden Boekelermeer en aanleg pijpleiding: <ul style="list-style-type: none"> TAQA kan na verlening vergunningen ook bij beroep op eigen risico beginnen Na 4 maanden doet Raad van State uitspraak op de voorlopige voorzieningen en kan eventueel een deel van de werkzaamheden stilgelegd worden Indien dit niet gebeurt kan TAQA voor eigen risico verder bouwen hangende de beroepszaken 	
Medio13	<i>Ingebruikname (injectie en productie) Bergermeer Gasopslag</i>	

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2009				2010				2011				2012				2013	
					kwart 1	2de kwart	3de kwart	4de kwart	1ste kwart	2de kwart	3de kwart	4de kwart	1ste kwart	2de kwart	3de kwart	4de kwart	1ste kwart	2de kwart	3de kwart	4de kwart	1ste kwart	2de kwart
1	Voorlopige Planning Bergermeer Gasopslag versie 2009-06-10 (mandje 1 & mandje 2)																					
2																						
3	Vergunningen (besluit-m.e.r.-plichtig; BG: provincie, EZ)	146 dagen	maa 17-11-08	din 9-6-09																		
4	MER + vergunningenaanvragen ingediend (TAQA) (Wm 7.17)	0 dagen	maa 17-11-08	maa 17-11-08																		
5	beoordelen aanvaardbaarheid MER (BG's) (Wm art 7.18)	6 wkn	maa 17-11-08	vri 26-12-08																		
6	uiterste datum voor niet-aanvaardbaar verklaren van het MER (Wm 7.18)	0 dagen	vri 26-12-08	vri 26-12-08																		
7	kennisgeving MER in Staatscourant, dag- en weekbladen (BG's) (Wm 7.20)	0 dagen	woe 14-1-09	woe 14-1-09																		
8	MER + vergunningaanvragen liggen ter inzage (BG's) (Awb 3:16)	31 dagen	don 15-1-09	don 26-2-09																		
9	informatieavond 1 (Bergen)	0 dagen	woe 4-2-09	woe 4-2-09																		
10	informatieavond 2 (Alkmaar)	0 dagen	woe 11-2-09	woe 11-2-09																		
11	adviestermijn Commissie voor de m.e.r. (Wm 7.26)	11 wkn	woe 14-1-09	din 31-3-09																		
12	Aanvullende informatie op MER	31 dagen	don 26-3-09	don 7-5-09																		
13	overleg eindconcept toetsingsadvies Cie m.e.r. (schatting)	0 dagen	don 7-5-09	don 7-5-09																		
14	Cie m.e.r. brengt toetsingsadvies uit	0 dagen	maa 11-5-09	maa 11-5-09																		
15	Cie m.e.r. brengt tweede toetsingsadvies uit	0 dagen	din 9-6-09	din 9-6-09																		
16																						
17	Toepassing RCR (RIP en vergunningen Armb Uitvoeringsbesluit RCR energie-infrastructuurprojecten) mandje 1	393 dagen	maa 2-3-09	woe 1-9-10																		
18	Toegangswet (art. 141a, 141 b en 141c Mbw) van kracht (moet zijn 1-3-2009)	0 dagen	maa 2-3-09	maa 2-3-09																		
19	opstellen voorontwerp-Rijksinpassingsplan (RIP)	15 wkn	maa 2-3-09	vri 12-6-09																		
20	versturen voorontwerp-RIP naar gesprekspartners art. 3.1.1-overleg	0 dagen	vri 12-6-09	vri 12-6-09																		
21	art 3.1.1 Bro-overleg met andere overheden (gem/prov/Rijk/waterschap) over voorontwerp-R.I.P.	6 wkn	maa 15-6-09	vri 24-7-09																		
22	AANAME: Bro-overleg	0 dagen	maa 29-6-09	maa 29-6-09																		
23	AANAME: art. 3.28, lid 1 Wro-overleg: het horen van de gemeenteraden en provinciale staten over voorontwerp-R.I.P.	3 dagen	maa 29-6-09	woe 1-7-09																		
24	opstellen ontwerp-RIP	4 wkn	maa 27-7-09	vri 21-8-09																		
25	Indienen vergunningaanvragen mandje 1 naar BG'n	0 dagen	woe 10-6-09	woe 10-6-09																		
26	AANAME: BG's schrijven ontwerp-vergunningen	9,4 wkn	don 11-6-09	vri 14-8-09																		
27	kennisgeving ontwerp-vergunningen (mandje 1) en ontwerp-Rijksinpassingsplan	0 dagen	woe 2-9-09	woe 2-9-09																		
28	Terinzagelegging ontwerp-vergunningen (mandje 1), ontwerp-Rijksinpassingsplan en MER	6 wkn	don 3-9-09	woe 14-10-09																		
29	AANAME: opstellen Rijksinpassingsplan (R.I.P) en vergunningen (mandje 1)	6 wkn	don 15-10-09	woe 25-11-09																		
30	kennisgeving/bekendmaking R.I.P. en vergunningen (mandje 1)	0 dagen	woe 9-12-09	woe 9-12-09																		
31	Terinzagelegging R.I.P en vergunningen (mandje 1) ter inzage	6 wkn	don 10-12-09	woe 20-1-10																		
32	beroepstermijn R.I.P en vergunningen (mandje 1)	6 wkn	don 10-12-09	woe 20-1-10																		
33	opstellen verweerschrift (mandje 1)	2 mndn	don 21-1-10	woe 17-3-10																		
34	uitspraak voorlopige voorziening (mandje 1)	0 dagen	woe 9-6-10	woe 9-6-10																		
35	bodemuitspraak (mandje 1)	0 dagen	woe 1-9-10	woe 1-9-10																		
36																						
37	Vergunningen in mandje 2	592 dagen	din 1-9-09	woe 7-12-11																		
38	Indienen vergunningaanvragen mandje 2 naar BG'n (aanname)	0 dagen	din 1-9-09	din 1-9-09																		
39	BG's schrijven ontwerp-vergunningen (mandje 2) (aanname)	8 wkn	din 1-9-09	maa 26-10-09																		
40	kennisgeving ontwerp-vergunningen (mandje 2)	0 dagen	woe 11-11-09	woe 11-11-09																		
41	Terinzagelegging ontwerp-vergunningen (mandje 2)	6 wkn	don 12-11-09	woe 23-12-09																		
42	opstellen vergunningen (mandje 2) (aanname)	8 wkn	don 24-12-09	woe 17-2-10																		
43	kennisgeving/bekendmaking vergunningen (mandje 2)	0 dagen	woe 3-3-10	woe 3-3-10																		
44	Terinzagelegging vergunningen (mandje 2)	6 wkn	don 4-3-10	woe 14-4-10																		
45	beroepstermijn vergunningen (mandje 2)	6 wkn	don 4-3-10	woe 14-4-10																		
46	opstellen verweerschrift (mandje 2)	2 mndn	don 15-4-10	woe 9-6-10																		
47	uitspraak voorlopige voorziening (mandje 2)	0 dagen	woe 1-9-10	woe 1-9-10																		
48	bodemuitspraak Rechtbank (mandje 2)	0 dagen	woe 11-5-11	woe 11-5-11																		
49	termijn hoger beroep	6 wkn	don 12-5-11	woe 22-6-11																		
50	uitspraak voorlopige voorziening hoger beroep (mandje 2)	0 dagen	woe 14-9-11	woe 14-9-11																		
51	bodemuitspraak RvS (mandje 2)	0 dagen	woe 7-12-11	woe 7-12-11																		

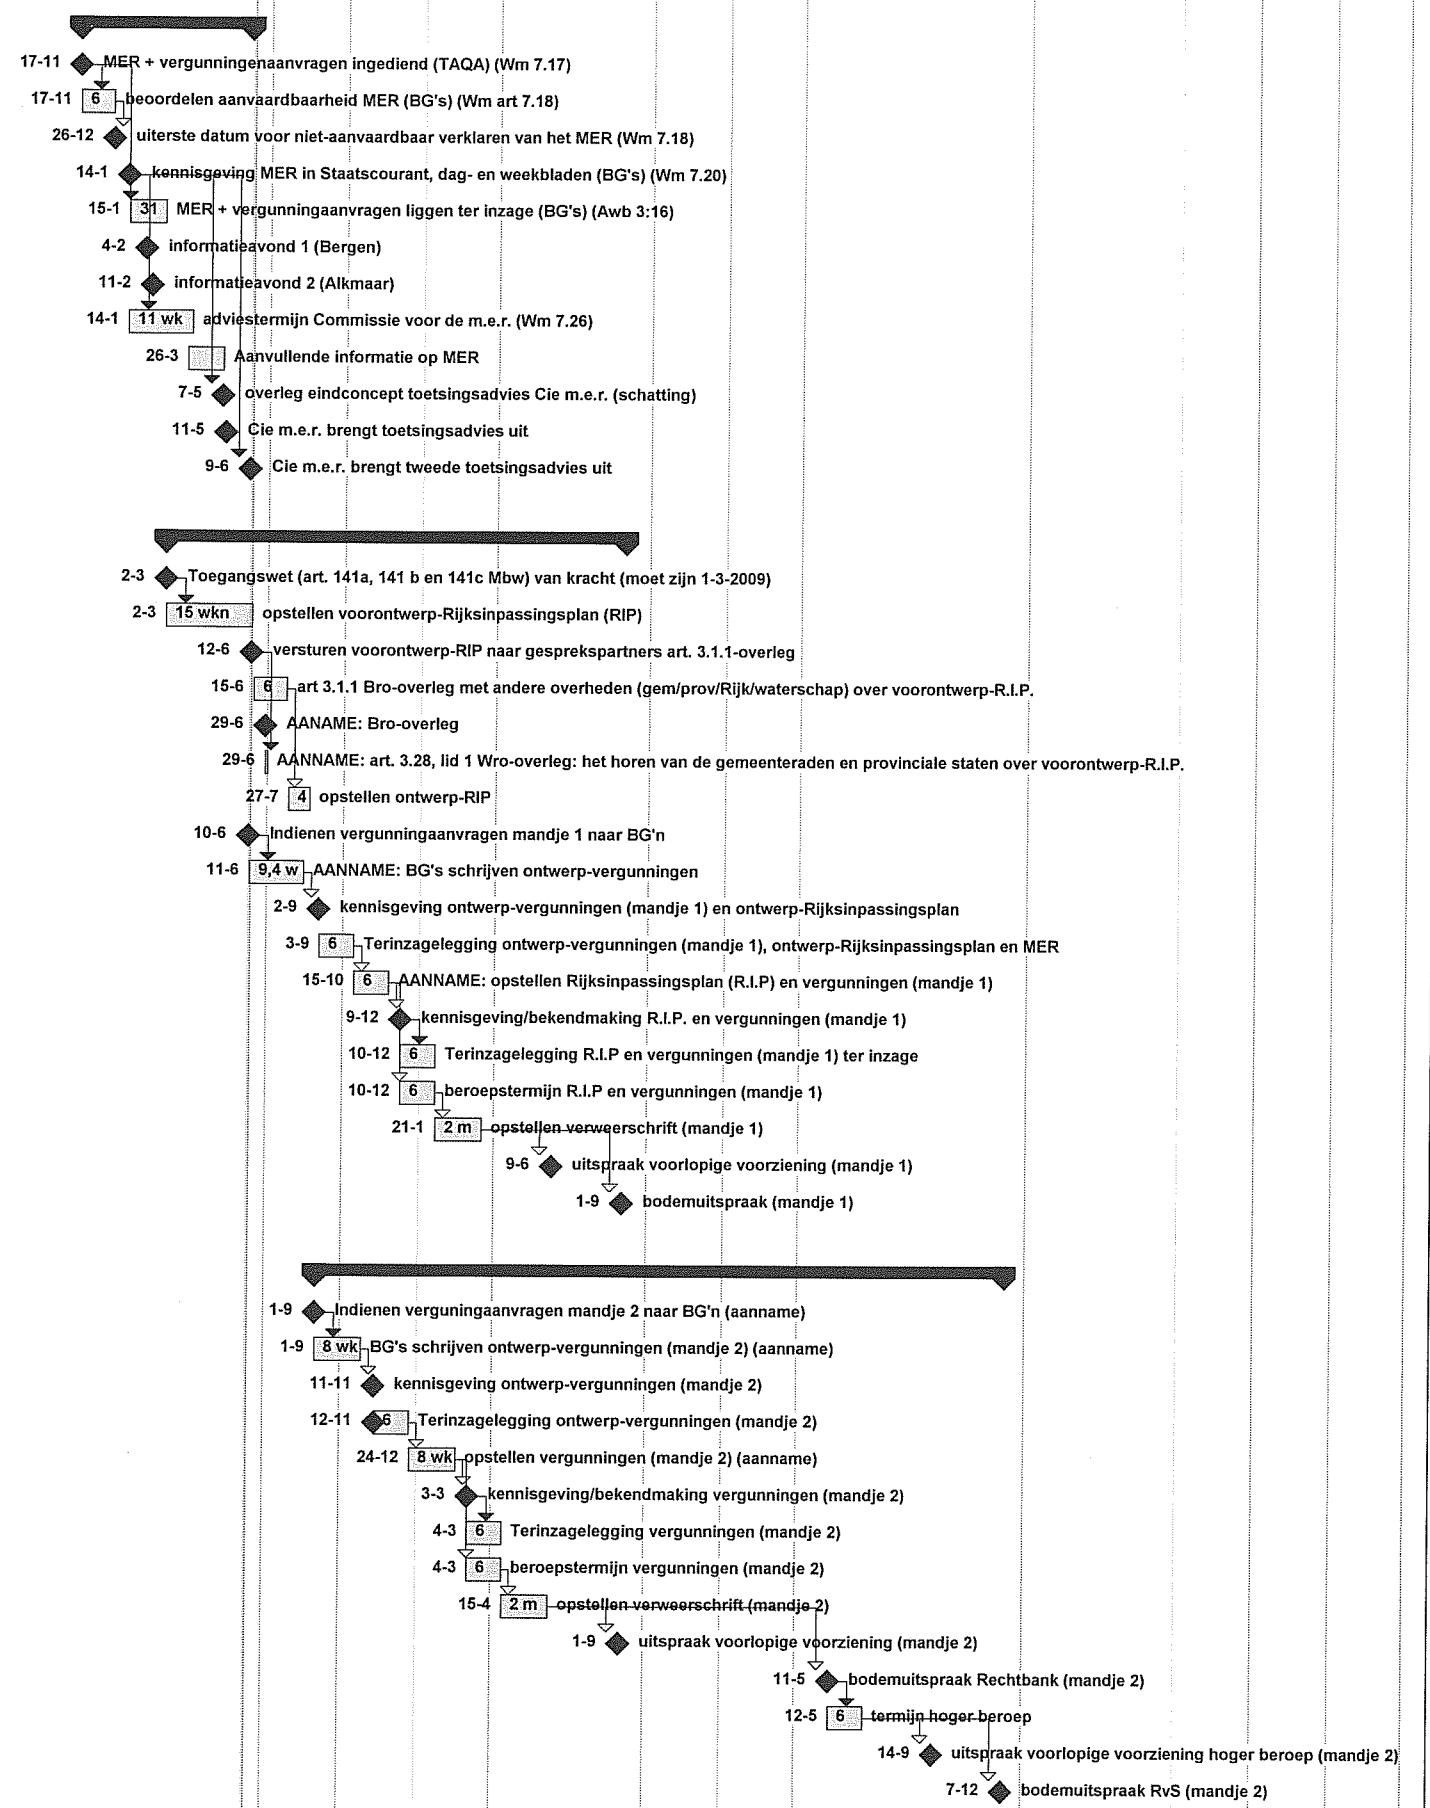

Project: 2009-06-10 RIP en RCR plann
Datum: woe 10-6-09

Taak: Voortgang: Samenvatting: Externe taken: Deadline:
 Splitsing: Mijlpaal: Projectsamenvatting: Externe mijlpaal:
